

Actul adițional nr. 2 la
Contractul de servicii nr. 130353 din 08.12.2016

Între:

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în incintă port Constanța, poarta 1, tel. 0241/61.61.24 fax 0241/61.62.29, înființată prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont nr. RO54TREZ23F845000710101X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentată prin **Director General – Alexandru MEZEI și Director Economic - Cristina CĂLINȚARU** în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte
și

SIVECO România S.A., cu sediul în București, Sos. București-Ploiești, nr. 73-81, București, sector 1, Complex Victoria Park, Corp C4, tel. +40 21 302 33 00, fax +40 21 302 33 91, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14658/1992, cod unic de înregistrare 476331, atribut fiscal RO, Cont Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București nr. RO57TREZ7005069XXX000594, reprezentată prin **Florian Gabriel ILIA, Președinte și Director General**, în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte.

În conformitate cu Nota nr. 89422/21.08.2017, prevederile art. 15 și 24 din contractul de servicii nr. 130353 din 08.12.2016, prin care se oferă posibilitatea modificării clauzelor contractului, prin act adițional, cu excepția clauzelor privind obiectul și prețul contractului,

Părțile contractante au hotărât de comun acord încheierea prezentului Act Adițional la Contract, cu următorul conținut:

Articolul I. Punctul 5.1 se modifică și va avea următorul conținut:

Durata prezentului contract este de 11 luni de la semnarea și înregistrarea acestuia.

Articolul II. (1) Graficul de prestare, anexă a contractului se modifică și se înlocuiește cu Anexa A Actualizată - Grafic de prestare, atașată la prezentul Act adițional.

(2) De la data semnării prezentului Act adițional, toate referirile la Graficul de prestare din Contract, vor fi înțelese și citite ca făcând referire la Anexa A Actualizată - Grafic de prestare, atașată la prezentul Act adițional nr. 2.

Articolul III. (1) Graficul de facturare și plăți, anexă a contractului se modifică și se înlocuiește cu Anexa B Actualizată - Grafic de facturare și plăți, atașată la prezentul Act adițional.

(2) De la data semnării prezentului Act adițional, toate referirile la Graficul de facturare și plăți din Contract, vor fi înțelese și citite ca făcând referire la Anexa B Actualizată - Grafic de facturare și plăți, atașată la prezentul Act adițional nr. 2.

Articolul IV. Celelalte prevederi ale Contractului de servicii nr. 130353 din 08.12.2016 rămân neschimbate în măsura în care nu contravin prezentului act adițional.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, 07.09.2017, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași forță juridică. Anexa A Actualizată și Anexa B Actualizată fac parte integrantă din prezentul act adițional.

ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
DIRECTOR GENERAL,
Alexandru MEZEI



PRESTATOR,
SIVECO România S.A. SOCIETATEA COMERCIALĂ
PREȘEDINTE ȘI DIRECTOR GENERAL,
Florian Gabriel ILIA



DIRECTOR ECONOMIC,
Cristina CĂLINTARU




DIRECTOR ECONOMIC,
Teodora MANEA



CFPP,

Felicia NUTU

VIZAY	
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	
NR. 8	
Suma	
Data	07.09.2017

ȘEF BIROU JURIDIC ȘI CONTENCIOS,
Andreea Vasilescu NAIDEN



VICEPREȘEDINTE CALITATE ȘI RESURSE UMANE,
Daniela BICHIR



DIRECTOR VÂNZĂRI DIRECTE
Florina NEGURA




DIRECTOR DEPARTAMENT SIVECO Applications,
Lăcrămioara BÂRSETI



CONSILIER JURIDIC,
Adelina PREDESCU



DIRECTOR VÂNZĂRI ZONĂ,
Lavinia ALEXA




Biroul IT,



ANEXA A Actualizată - Grafic de prestare

ID	Nume	SIVECO_Delimitare	Durata	Start	Finish	Resursa
1	Upgrade sistem integrat ERP (Financiar, Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane) pentru AUTORITATEA NAVALA ROMANA (ANR) Semnare contract		433 days?	Thu 12/28/16	Wed 10/21/17	
2	Startarea proiect		1 day?	Thu 12/22/16	Thu 12/22/16	
3	WP 1 Auditarea securității sistemului informatic existent la ANR		1 day?	Thu 12/15/16	Thu 12/15/16	2FS-4 days
4	WP 1 Auditarea securității sistemului informatic existent la ANR		43 days?	Fri 12/23/16	Thu 2/9/17	
5	Audierea securității sistemului informatic existent la ANR		36 days	Fri 12/23/16	Tue 1/25/17	2 Expert de audit și scribere
6	Livrare Raport de audit de securitate a sistemului informatic existent la ANR		1 day?	Wed 2/1/17	Wed 2/1/17	5
7	Acordarea Raport de audit de securitate a sistemului informatic existent la ANR		1 day?	Thu 2/9/17	Thu 2/9/17	6FS-4 days
8	WP 2 Implementarea sistemului informatic integrat SIVECO din anul 2020 la ANR		159 days?	Thu 12/28/17	Tue 10/31/17	
9	WP 2.1 Analiza detaliata a fluxurilor de lucru si proiectare		120 days?	Thu 12/28/17	Wed 7/12/17	3FS-26 days
10	Pila electronica		42 days?	Mon 2/6/17	Tue 4/4/17	
11	Analiza si Proiectare Pila electronica		33 days	Mon 2/6/17	Wed 3/22/17	Consultant ERP
12	Livrare document de analiza si proiectare Pila electronica		1 day?	Wed 3/22/17	Wed 3/22/17	
13	Acordarea document de analiza si proiectare Pila electronica		1 day?	Tue 4/4/17	Tue 4/4/17	12FS-4 days
14	Management Financiar-Contabil		44 days?	Thu 2/2/17	Tue 4/4/17	
15	Analiza si Proiectare Management Financiar-Contabil		31 days	Thu 2/2/17	Thu 3/16/17	Consultant ERP
16	Livrare document de analiza si proiectare Management Financiar-Contabil		1 day?	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17	15
17	Acordarea document de analiza si proiectare Management Financiar-Contabil		1 day?	Tue 4/4/17	Tue 4/4/17	16FS-11 days
18	Mijlocul Fix si Obiecte de Inventar		44 days?	Thu 2/2/17	Tue 4/4/17	
19	Analiza si Proiectare Mijlocul Fix si Obiecte de Inventar		31 days	Thu 2/2/17	Thu 3/16/17	Consultant ERP
20	Livrare document de analiza si proiectare Mijlocul Fix si Obiecte de Inventar		1 day?	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17	19
21	Acordarea document de analiza si proiectare Mijlocul Fix si Obiecte de Inventar		1 day?	Tue 4/4/17	Tue 4/4/17	20FS-11 days

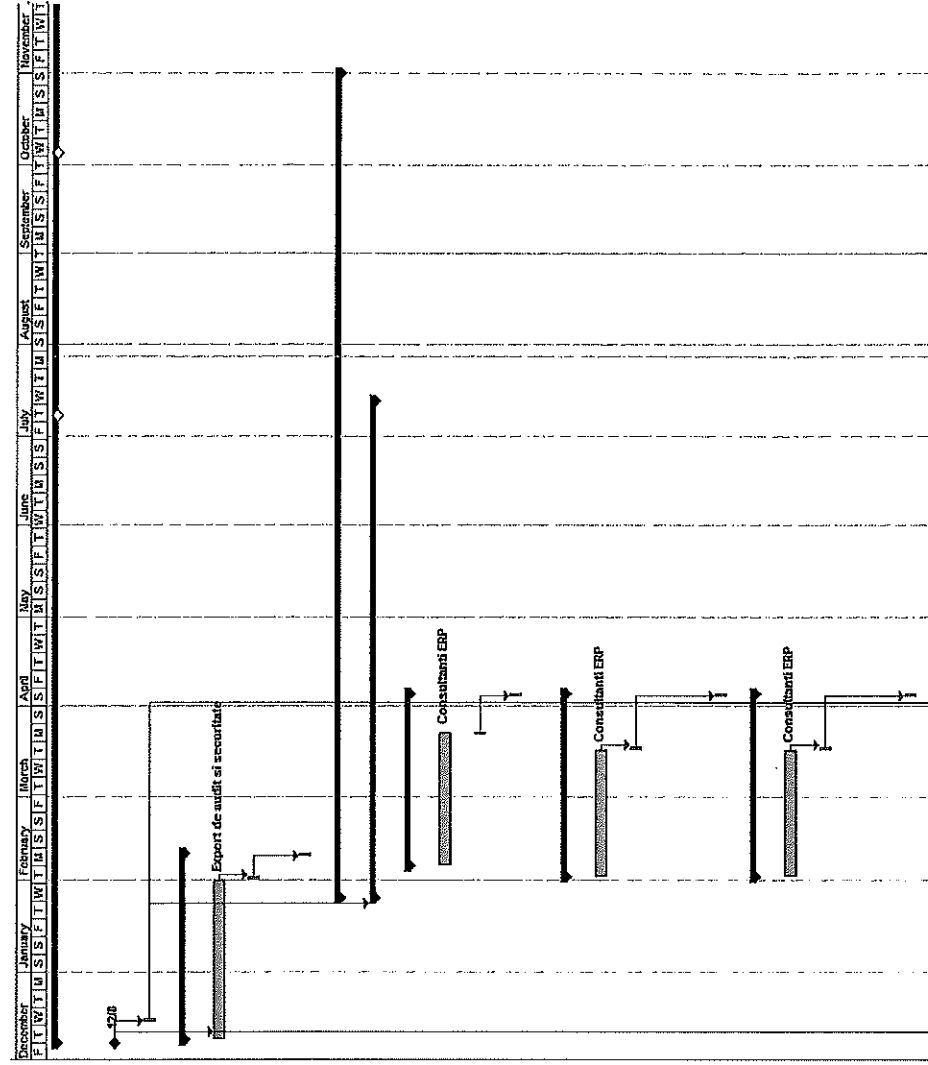



D	Nume	SIVECO_Delivrabile	Duration	Start	Finish	Intrecescu	Resource Names	Calendar														
								December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November			
22	Bugete si Executii bugetara		24 days?	Thu 3/21/17	Tue 4/4/17																	
23	Analiza si Proiectare Bugete si Executii bugetara		17 days	Thu 3/23/17	Fri 3/24/17		Consultant ERP															
24	Livrare document de analiza si proiectare Bugete si Executii bugetara	Document de analiza si proiectare bugete si Executii bugetara. Plan de tesare functional, Plan de tesare functionale, Plan de tesare de acceptanta	1 day?	Wed 3/22/17	Wed 3/22/17																	
25	Aprobare document de analiza si proiectare Bugete si Executii bugetara		1 day?	Tue 4/4/17	Tue 4/4/17	24FS-8 days																
26	Contract		41 days?	Wed 2/15/17	Wed 4/12/17																	
27	Analiza si Proiectare Contracte		22 days	Wed 2/15/17	Thu 3/16/17		Consultant ERP															
28	Livrare document de analiza si proiectare Contracte	Document de analiza si proiectare contracte, Plan de tesare functional, Plan de tesare functionale, Plan de tesare de acceptanta	1 day?	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17	27																
29	Aprobare document de analiza si proiectare Contracte		1 day?	Wed 4/12/17	Wed 4/12/17	28FS-17 days																
30	Salariu		41 days?	Thu 2/16/17	Thu 4/13/17																	
31	Analiza si Proiectare Salariu		22 days	Thu 2/16/17	Fri 3/17/17		Consultant ERP															
32	Livrare document de analiza si proiectare Salariu	Document de analiza si proiectare Salariu, Plan de tesare functional, Plan de tesare functionale, Plan de tesare de acceptanta	1 day?	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17																	
33	Aprobare document de analiza si proiectare Salariu		1 day?	Thu 4/13/17	Thu 4/13/17	32FS-18 days																
34	Resurse Umane		56 days?	Thu 1/26/17	Thu 4/13/17																	
35	Analiza si Proiectare Resurse Umane		37 days	Thu 1/26/17	Fri 3/17/17		Consultant ERP															
36	Livrare document de analiza si proiectare Resurse Umane	Document de analiza si proiectare Resurse Umane, Plan de tesare functional, Plan de tesare functionale, Plan de tesare de acceptanta	1 day?	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17																	
37	Aprobare document de analiza si proiectare Resurse Umane		1 day?	Thu 4/13/17	Thu 4/13/17	35FS-18 days																

97



290




ID	Name	SIVECO Deliverable	Duration	Start	Finish	Resource Name	Calendar											
							December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November
38	Transporturi		30 days?	Wed 2/22/17	Tue 4/4/17		F T T W T T	S S F F T T	M M S S F F	T T W T T W	T T S S F F	T T W T T W	T T S S F F	T T W T T W	T T S S F F	T T W T T W	T T S S F F	
39	Analiza si Proiectare Transporturi		15 days	Wed 2/22/17	Tue 3/14/17	Consultant ERP												
40	Livrare document de analiza si proiectare Transporturi	Document de analiza si proiectare Transporturi Plan de testare functionala; Plan de testare de acceptanta	1 day?	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17	39												
41	Aprobare document de analiza si proiectare Transporturi		1 day?	Tue 4/4/17	Tue 4/4/17	40FS-11 days												
42	Stocuri si coduri de bare		42 days?	Mon 2/6/17	Tue 4/4/17													
43	Analiza si Proiectare Stocuri si coduri de bare		29 days	Mon 2/6/17	Thu 3/16/17	Consultant ERP												
44	Livrare document de analiza si proiectare Stocuri si coduri de bare	Document de analiza si proiectare Stocuri si coduri de bare; Plan de testare functionala; Plan de testare de acceptanta	1 day?	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17	43												
45	Aprobare document de analiza si proiectare Stocuri si coduri de bare		1 day?	Tue 4/4/17	Tue 4/4/17	44FS-11 days												
46	Raportare - SIVECO Business Analyst		107 days?	Tue 2/14/17	Wed 7/12/17													
47	Analiza si Proiectare Raportare - SIVECO Business Analyst (SBA)		35 days	Tue 2/14/17	Mon 4/3/17	Consultant ERP												
48	Livrare document de analiza si proiectare Raportare - SIVECO Business Analyst	Document de analiza si proiectare Raportare - SBA; Plan de testare functionala; Plan de testare de acceptanta	1 day?	Thu 6/15/17	Thu 6/15/17	47FS-20 days												
49	Aprobare document de analiza si proiectare Raportare - SIVECO Business Analyst		1 day?	Wed 7/12/17	Wed 7/12/17	48FS-08 days												
50	VP 2.2 Instalare SIVECO Applications 2020		36 days	Wed 2/22/17	Wed 4/12/17													
51	Livrare licenta SIVECO Applications 2020	Certificat de licenta SIVECO Applications	1 day	Wed 4/12/17	Wed 4/12/17													
52	Instalare SIVECO Applications 2020	Raport de instalare SIVECO Applications 2020	27 days	Wed 2/22/17	Thu 3/30/17	DBA												
53	Livrare raport de instalare SIVECO Applications 2020 si Software Oracle		1 day	Wed 4/12/17	Wed 4/12/17	52FS-8 days												
54	Aprobare raport de instalare SIVECO Applications 2020 si Software Oracle		1 day	Wed 4/12/17	Wed 4/12/17													

[Handwritten signatures and initials]



D	Name	SIVECO_Deliverable	Duration	Start	Finish	Resource Names
55	WP 2.3 Dezvoltare / Parametrizare / Configurare si testare sistem		137 days?	Thu 3/22/17	Fri 9/8/17	
56	Dezvoltare functionala si implementare pentru aplicatia contabile		108 days	Thu 3/23/17	Mon 7/31/17	Dezvoltatori ERP
57	Parametrizare / Configurare conform specificatiilor de proiectare		14 days	Tue 3/14/17	Fri 3/31/17	Consultant ERP
58	Testare internă		3 days	Thu 3/30/17	Mon 4/3/17	Consultant ERP
59	Livrare documentatie tehnica si manuale de utilizare SIVECO Applications 2020	Documentatie tehnica si manuale de utilizare SIVECO Applications 2020	1 day?	Thu 8/31/17	Thu 8/31/17	58FS-5 days
60	Aprobare documentatie tehnica si manuale de utilizare SIVECO Applications 2020		1 day?	Fri 9/8/17	Fri 9/8/17	58FS-5 days
61	Livrare documentatie tehnica si manuale de utilizare SIVECO Business Analyzer		25 days?	Fri 7/28/17	Thu 8/31/17	58
62	Aprobare documentatie tehnica si manuale de utilizare SIVECO Business Analyzer	Documentatie tehnica si manuale de utilizare SIVECO Applications 2020	1 day?	Fri 9/8/17	Fri 9/8/17	61FS-5 days
63	WP 2.4 Instalare personal IT AUR pentru administrarea si mentinuta aplicatiei (8 persoane)		15 days?	Mon 3/27/17	Wed 4/12/17	
64	Realizare sesiuni de instruire pentru administratori/membrii aplicatiei		3 days	Mon 3/27/17	Wed 3/29/17	Consultant ERP
65	Livrare documentatie de instruire	Documentatie de instruire (plan de instruire, programe cursuri, lista de prezenta, rapoarte de instruire, evaluari feedback)	1 day?	Wed 4/12/17	Wed 4/12/17	64FS-9 days
66	Aprobare documentatie de instruire		1 day?	Wed 4/12/17	Wed 4/12/17	
67	WP 2.5 Instalare utilizatori componente (min 75 utilizatori)		107 days?	Thu 5/11/17	Fri 10/6/17	66FS-4 day
68	Realizare sesiuni de instruire pe componente		35 days	Thu 5/11/17	Wed 9/20/17	Consultant ERP
69	Livrare documentatie de instruire	Documentatie de instruire (plan de instruire, programe cursuri, lista de prezenta, rapoarte de instruire, evaluari feedback)	1 day?	Thu 9/28/17	Thu 9/28/17	68FS-5 days
70	Aprobare documentatie de instruire		1 day?	Fri 10/6/17	Fri 10/6/17	69FS-5 days
71	WP 2.6 Testare		20 days?	Mon 9/11/17	Fri 10/6/17	62
72	Testare functionala componente		3 days	Mon 9/11/17	Wed 9/13/17	Consultant ERP
73	Livrare documente cu rezultate testari functionale pe componente	Documente cu rezultate testari functionale pe componente	1 day?	Thu 9/14/17	Thu 9/14/17	72
74	Aprobare documente cu rezultate testari functionale pe componente		1 day?	Fri 9/22/17	Fri 9/22/17	73FS-5 days
75	Testare de acceptanta componente		3 days	Mon 9/25/17	Wed 9/27/17	74 Consultant ERP
76	Livrare documente cu rezultate testari de acceptanta pe componente	Documente cu rezultate testari de acceptanta pe componente	1 day?	Thu 9/28/17	Thu 9/28/17	75
77	Aprobare documente cu rezultate testari de acceptanta pe componente		1 day?	Fri 10/6/17	Fri 10/6/17	76FS-5 days

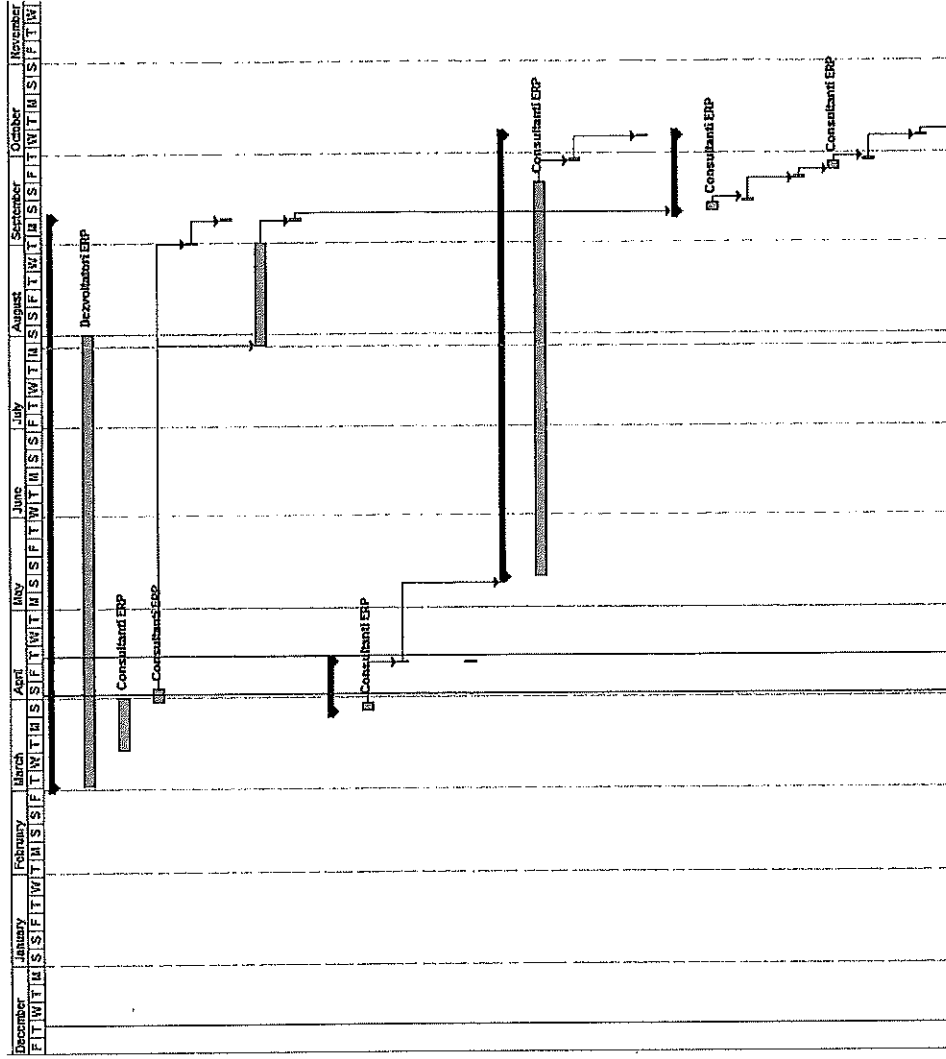

[Handwritten signatures and initials]
288



SIVECO
ROMANIA

Soft care contează



D	Name	SIVECO_Diverse	Durabilita	Start	Finish	Address	Resource Names
78	WP 2.7 Centralizare si import date		78 days	Wed 3/29/17	Sat 7/15/17		
79	Import de test si verificare	Raport de activitate	78 days	Wed 3/29/17	Sat 7/15/17		Consultant ERP DBA
80	Import final si verificare	Raport de activitate	78 days	Wed 3/29/17	Sat 7/15/17		Consultant ERP DBA
81	WP 2.8 Asistenta tehnica		152 days?	Mon 4/3/17	Tue 10/3/17		
82	Intrarea in productie a sistemului		1 day?	Mon 4/3/17	Mon 4/3/17		
83	Asistenta tehnica pentru utilizarea in productie a sistemului	Raport de asistenta tehnica	152 days	Mon 4/3/17	Tue 10/3/17		Consultant ERP
84	WP 2.9 Suport tehnic		135 days	Tue 4/4/17	Mon 10/9/17		
85	Suport tehnic pentru utilizarea in productie a sistemului	Raport activitate rezolvare incidente JIRA	135 days	Tue 4/4/17	Mon 10/9/17		Echipe Suport tehnic
86	WP 2.10 Acceptanta finala		17 days	Mon 10/9/17	Tue 10/3/17		
87	Seminarul Procesului Verbal de Acceptanta finala	Procesul Verbal de Acceptanta finala	1 day	Mon 10/9/17	Mon 10/9/17		
88	Suport tehnic pentru utilizarea in productie a sistemului	Raport activitate rezolvare incidente JIRA	16 days	Tue 10/10/17	Tue 10/3/17		Echipe Suport tehnic
89	WP 3 Auditarea finala a securitatii sistemului informatizat		107 days?	Thu 4/13/17	Fri 9/8/17		
90	Auditarea finala a securitatii sistemului informatizat si iesirea de securitate		160 days	Thu 4/13/17	Wed 8/30/17		Expert de audit si securitate
91	Livrare Raport de audit de securitate a sistemului informatizat	Raport de audit de securitate sistem informatizat final	1 day?	Thu 8/31/17	Thu 8/31/17		
92	Acrobare Raport de audit de securitate a sistemului informatizat final		1 day?	Fri 9/8/17	Fri 9/8/17		91FS-5 days

287

ID	Titlu	SIVECO_Delivrabile	Durata	Start	Finish	Resurse
93	WP-4 Management de proiect și managementul calității		234 days?	Fri 12/29/16	Tue 10/31/17	
94	WP 4.1 Implementarea și planificarea proiectului		18 days?	Fri 12/29/16	Tue 12/29/16	
95	Prepararea planului de asigurare a calității și a planului de comunicare		1 day	Fri 12/29/16	Fri 12/29/16	2 Manager de proiect
96	Inițierea și stabilirea proiectului	Înțelegerea scopului proiectului	1 day	Mon 12/21/16	Mon 12/21/16	95
97	Prețarea planului de asigurare a calității și a planului de comunicare	Plan de asigurare a calității și Plan de comunicare	1 day?	Mon 12/21/16	Mon 12/21/16	95
98	Aprobarea planului de asigurare a calității și a planului de comunicare		1 day?	Tue 12/29/16	Tue 12/29/16	97/94-95
99	WP 4.2 Monitorizarea și Controlul proiectului		132 days	Mon 4/3/17	Wed 10/4/17	98
100	Monitorizarea și Controlul activităților proiectului		0 days	Tue 5/2/17	Tue 5/2/17	Manager de proiect
101	Prețarea Raport trimestral 1	Raport trimestral 1	0 days	Mon 4/24/17	Mon 4/24/17	95-97
102	Prețarea Raport trimestral 2	Raport trimestral 2	0 days	Fri 7/7/17	Fri 7/7/17	101/95-99
103	Prețarea Raport trimestral 3	Raport trimestral 3	0 days	Wed 10/4/17	Wed 10/4/17	102/95-99
104	WP 4.3 Închiderea proiectului		5 days	Wed 10/25/17	Tue 10/24/17	
105	Prețarea Raport final	Raport final	0 days	Wed 10/25/17	Wed 10/25/17	Manager de proiect
106	Aprobarea Raportului		0 days	Tue 10/31/17	Tue 10/31/17	105/95-9
107	WP 5 Garantie și mentenanța sistem		261 days	Wed 11/1/17	Wed 10/24/18	
108	Support tehnic (garanție și mentenanță)		261 days	Wed 11/1/17	Wed 10/24/18	98

ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
 DIRECTOR GENERAL,
 Alexandru MEZEI



(Signature)



PRESTATOR,
SIVECO România S.A.
 PREȘEDINTE ȘI DIRECTOR GENERAL,
 Florian Gabriel ILIA


(Signature)

(Handwritten notes and signatures)

Anexa B Actualizată - Grafic de facturare și plăți

Nr Crt	Activitatea (gama / faza)	Cantitatea [UM]	Pret Unitar		Pret Total		Taxa pe valoarea adaugata [Lei]	Termen maximal de livrare si receptie	Facturare
			[Lei/UM]*	[EURO/UM]*	[Lei]* (col 2xcol 3)	[EURO]* (col 2x col 4)			
0	1	2	3	4	5	6	7		
1	Organizarea proiectului, pregatirea planului de asigurare a calitatii proiectului, nominalizarea echipei de proiect, prima sedinta de proiect la client	1	1.867,50	415,00	1.867,50	415,00	373,50	15-Dec-2016	
2	Analiza sistemului existent (fluxuri de lucru ANR Central si 5 capitani) in vederea stabilirii necesitatilor de configurare, parametrizare si setare la nivel de baza centralizata (inclusiv redactarea documentelor de analiza si a planurilor de migrare date, de testare functionala si de testare de acceptanta finala)	40	1.867,50	415,00	74.700,00	16.600,00	14.193,00	12-Apr-2017	
3	Instalarea sistemului (baza de date Oracle, baza de date SIVICO Applications 2020, componentele oferite) pe server (baza PROD si baza TEST)	8	1.867,50	415,00	14.940,00	3.320,00	2.838,60	12-Apr-2017	
4	Dezvoltare, configurare, parametrizare, setare sistem centralizat - pentru componentele SIVICO Applications 2020	30	1.867,50	415,00	56.025,00	12.450,00	10.644,75	8-Sep-2017	
5	CENTRALIZARE - Verificarea datelor pregatite pentru importul de date, import de test, verificarea coerenței și consistenței datelor importate, import final, verificări finale pe datele importate; SE REPORNESTE CU SOLIDURI; NU SE CENTRALIZEAZA	35	1.867,50	415,00	65.362,50	14.525,00	12.418,88	15-Jul-2017	
6	Instruire utilizatori finali SIVICO Applications 2020 (min 125 persoane)	11	1.867,50	415,00	20.542,50	4.565,00	3.903,08	6-Oct-2017	
7	Instruire administratori sistem (8 persoane)	3	1.867,50	415,00	5.602,50	1.245,00	1.064,48	12-Apr-2017	
8	Realizarea testelor de acceptanta functionala, pe baza fluxurilor pe componente	3	1.867,50	415,00	5.602,50	1.245,00	1.064,48	13-Sep-2017	
9	Realizarea testelor de acceptanta finala, pe baza fluxurilor de integrare	3	1.867,50	415,00	5.602,50	1.245,00	1.064,48	27-Sep-2017	
10	Asistenta tehnica acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului; obtinerea si verificarea rezultatelor pe baza rapoartelor din sistem	40	1.867,50	415,00	74.700,00	16.600,00	14.193,00	29-Sep-2017	
11	Servicii de audit de securitate (2 rapoarte de audit)	24	1.867,50	415,00	44.820,00	9.960,00	8.515,80	8-Sep-2017	
12	Servicii implementare functionalitati software specifice plata electronica	10	1.867,50	415,00	18.675,00	4.150,00	3.548,25	20-Oct-2017	

 Emitere factura
 in maxim 5 zile
 de la data
 receptiei




13	Servicii migrare client server-web Siveco Business Analyser	8	1.867,50	415,00	14.940,00	3.320,00	2.838,60	30-Aug-2017	
14	Management de proiect	24	1.867,50	415,00	44.820,00	9.960,00	8.515,80	25-Oct-2017	
	Total servicii SIVECO - Consultanta si implementare				448.200,00	99.600,00	85.176,68		
15	Solutie pentru implementarea functionalitatilor software specifice codurilor de bare, din care:								
	Servicii implementare functionalitati software specifice coduri de bare	20	1.867,50	415,00	37.350,00	8.300,00	7.096,50	15-Sep-2017	Emitere factura in maxim 5 zile de la data receptiei
	Solutie de inventariere	7	5.647,50	1.255,00	39.532,50	8.785,00	7.511,18	15-Sep-2017	
	Solutie cod de bare	7	1.156,50	257,00	8.095,50	1.799,00	1.538,15	15-Sep-2017	
	Total solutie pentru implementarea functionalitatilor software specifice codurilor de bare				84.978,00	18.884,00	16.145,82		
16	Oracle Standard Edition pe procesor	2	59.689,63	13.264,36	119.379,26	26.528,72	22.682,06	5-Apr-2017	
17	Oracle Standard Edition - Suport tehnic pentru un an de la data achizitionarii	2	15.281,87	3.395,97	30.563,73	6.791,94	5.807,11	5-Apr-2017	
18	Oracle Forms&Reports - pe procesor	2	82.168,51	18.259,67	164.337,01	36.519,34	31.224,03	5-Apr-2017	
19	Oracle Forms&Reports - Suport tehnic pentru un an de la data achizitionarii	2	20.083,37	4.462,97	40.166,73	8.925,94	7.631,68	5-Apr-2017	
	Total Licente ORACLE				354.446,73	78.765,94	67.344,88		
	Total				887.624,73	197.249,94	168.667,37		

*fara TVA

ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
DIRECTOR GENERAL,
Alexandru MIZEZ



PRESTATOR,
SIVECO România S.A.
PREȘEDINTE ȘI DIRECTOR GENERAL,
Florin Gabriel ILIA



7

[Handwritten signatures and initials]
